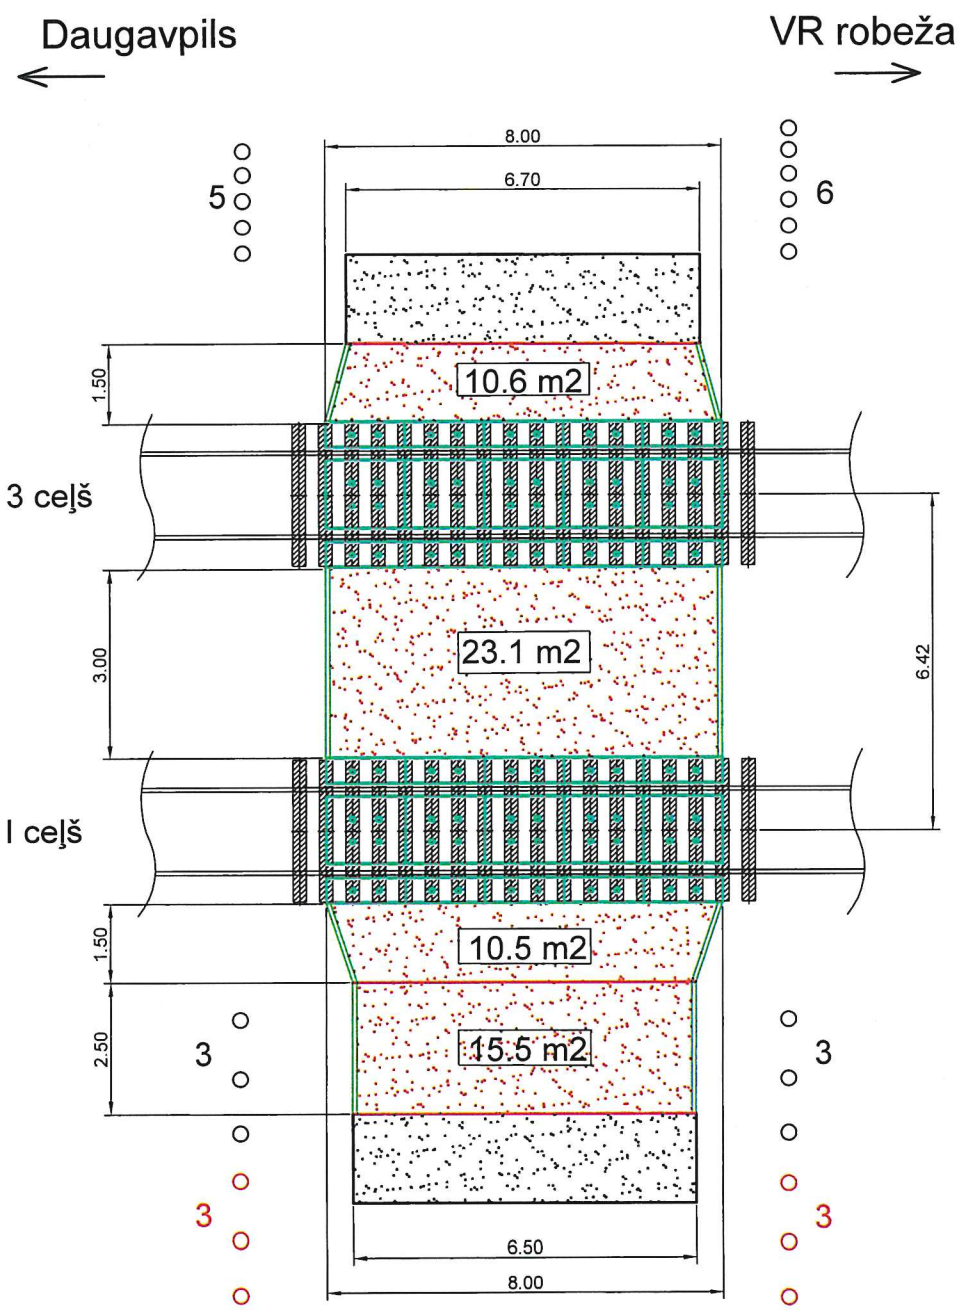

- Esošais asfalts
- Asfaltbetons projekts
- Bortakmens

Darbu apjomi

Nosaukums	Izpilde	Mērvienība	Apjoms
Pamatnes izbūve un asfaltbetona seguma ieklāšana	konkurs	m2	59.7
Signālstabinš (jaunie)	SCP	gab.	6
Bortakmens 1000x220x150	konkurs	gab.	19

1. Shēma attiecas tikai auto ceļa atjaunošanas pēc demontāžas.
2. Pirms rakšanas darbiem (komunikācijas) saskaņot ar visām iesaistītām institūcijām.
3. Nepieciešamā asfaltbetona seguma biezumam pārbrauktuvē jābūt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem

	Uzvārds	Paraksts	Dat.
Rasēja	V.Buiko		10.01.22
Uzmērīja	D.Voroškevičs		
Pārbaudīja	A.Gorjajevs		
Apstiprina	A.Arefjevs		

LATVIJAS DZELZCEĻŠ

VAS "Latvijas dzelzceļš" SCP, CPRD

st. Indra

Stadija	Lapa	Lapas
	1	1

Dzelz.pārbraukt.Nr.343
st.Indra 458.906 km
